

# 遮熱ガラスコーティング 施工写真



① 温度測定  
施工前温度 **28℃**



② 洗浄・研磨

- ・ ガラス表面の、砂ホコリ等の汚れをガラス用洗剤で清掃
- ・ ガラス表面の、油脂ヤニ等の汚れを研磨剤で清掃




③ 養生

塗料が、ガラス面以外に付着しないよう保護します。



④ ローラー塗装

1、配り工程 → 2、仕上げ工程 とローラーで塗料を塗布します。

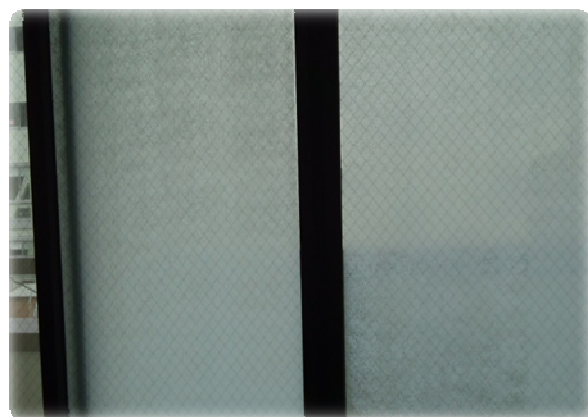

⑥ 温度測定  
施工後温度 **26℃**

遮熱ガラスコーティング  
施工完了！

⑤ 乾燥  
4時間程度

メリット

- ・ 遮熱コーティング施工直後に、温度の低減効果が得られます。

デメリット

- ・ 遮熱コートでは、結露の抑制が不可能な為、冬場の結露で膨れ・剥がれ等の不具合が起こる事が想定されます。
- ・ コーティングに傷が付きやすい為、清掃等は水拭きで簡単に行ってください。
